

BOLETIM DE MEDIÇÃO

008



PREFEITURA MUNICIPAL DE	FERREIROS/PE	DATA MEDIÇÃO:	13/07/2023	VALOR DA MEDIÇÃO:	30.690,98
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA – PORTAL E ACESSIBILIDADE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE DE FERREIROS/PE			CONTRATO R\$:	292.886,44
CONTRATO:	075/PMF/2022	MODALIDADE:	TP 003/2022	ADITIVO R\$:	0,00
PRazos DE EXEC.:	25/11/2022	25/03/2023		C. ADITADO R\$:	292.886,44
ORDEM DE SERVIÇOS:	25/11/2022	PRazo (DIAS):	120	ADITIVO (DIAS):	120
EMPRESA CONTRATADA:	A.D.S- CONSTRUTORA LTDA	PROPRIETÁRIO:	FAGNER EMANUEL SILVA DE MENDONÇA	DATA FINAL:	25/07/2023
CNPJ:	21.591.562/0001-27	CPF:	083.773.304-90	P. RESTANTE DIAS:	12
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES	CREA:	180063428-5 PE20220896917	SALDO R\$:	72.224,49
		PERÍODO DE MEDIÇÃO:	26/06/2023	À	13/07/2023
GESTOR DE CONTRATO:	CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA	MATRÍCULA:	608-4		
FISCAL DE CONTRATO:	FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA	CREA/RPN:	160.666.136-1		
ENGENHEIRO FISCAL:	ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA	CREA/RPN:	160.991.108-3_PE20230900425		
CNO:	90.013.37428/76				

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE REPROGRAMADA			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.847,42	1.167,80	15.438,76	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						11.913,08	1.167,80	7.504,42	
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	57,97	120,33	11,80	75,80	6.976,14	683,85	4.394,49	62,99%
1.1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,62	200,55	19,66	126,33	4.936,94	483,95	3.109,93	62,99%
1.2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						7.934,34	0,00	7.934,34	
1.2.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	209,92	6,00	0,00	6,00	1.258,92	0,00	1.258,92	100,00%
1.2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	556,29	12,00	0,00	12,00	6.675,42	0,00	6.675,42	100,00%
2	CALÇADAS						162.654,36	5.126,18	136.862,52	
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P	M	45,26	318,99	0,00	14,90	14.436,84	0,00	674,34	4,67%
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	47,87	1.026,27	0,00	1.025,40	49.123,45	0,00	49.081,80	99,92%

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.07.13 16:04:04 -03'00'



Documento assinado digitalmente
JOSE SERGIO BEZERRA GOMES
Data: 14/07/2023 06:39:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Claudionor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE REPOGRAMADA			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	74,16	1.211,84	69,12	1.123,77	89.873,18	5.126,18	83.341,43	92,73%
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	103,05	89,48	0,00	36,53	9.220,88	0,00	3.764,95	40,83%
3	CICLOFAIXA						97.614,51	24.397,00	24.397,00	
3.1	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M2	3,12	532,71	181,10	181,10	1.663,59	565,56	565,56	34,00%
3.2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF 04/2022	M2	131,59	532,71	181,10	181,10	70.099,65	23.831,44	23.831,44	34,00%
3.3	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	75,97	187,00	0,00	0,00	14.205,60	0,00	0,00	0,00%
3.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	19,52	596,51	0,00	0,00	11.645,67	0,00	0,00	0,00%
4	SINALIZAÇÃO						4.331,34	0,00	0,00	
4.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	26,84	30,60	0,00	0,00	821,28	0,00	0,00	0,00%
4.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	125,75	4,00	0,00	0,00	502,98	0,00	0,00	0,00%
4.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM FIBRA, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	250,59	8,00	0,00	0,00	2.004,72	0,00	0,00	0,00%
4.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	250,59	4,00	0,00	0,00	1.002,36	0,00	0,00	0,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						57.045,16	0,00	43.963,67	
5.1	MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M	M	121,67	69,03	0,00	0,00	8.398,62	0,00	0,00	0,00%
5.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	UN	43,41	40,00	0,00	0,00	1.736,22	0,00	0,00	0,00%
5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	73,16	96,60	0,00	96,60	7.067,26	0,00	7.067,25	100,00%
5.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	89,41	310,00	0,00	310,00	27.717,10	0,00	27.717,10	100,00%

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.07.13 16:04:17 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE SERGIO BEZERRA GOMES
Data: 14/07/2023 06:41:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Cláudio Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE REPOGRAMADA			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
5.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	149,20	12,00	0,00	12,00	1.790,40	0,00	1.790,40	100,00%
5.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	264,91	15,00	0,00	15,00	3.973,65	0,00	3.973,65	100,00%
5.7	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	368,33	8,00	0,00	0,00	2.946,64	0,00	0,00	0,00%
5.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	49,79	64,40	0,00	64,40	3.206,48	0,00	3.206,47	100,00%
5.9	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,88	10,00	0,00	10,00	208,80	0,00	208,80	100,00%
TOTAL							341.492,79	30.690,98	220.661,95	64,62%

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.07.13 16:04:29 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claudionor Manoel de Oliveira
Sec. de Planejamento e Urbanismo
123-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE SERGIO BEZERRA GOMES
Data: 14/07/2023 06:37:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AD-3 - CONSTRUTORA LIDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 008

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA – PORTAL E ACESSIBILIDADE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE DE FERREIROS/PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE				OBSERVAÇÕES
					MEDIDO NO PERÍODO				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				% BM ANTERIOR	% BM ATUAL	EVOLUÇÃO (%)	TOTAL	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	57,97	103,20	53,19%	64,62%	11,43%	11,80	De acordo com a evolução da obra
1.1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,62	172,00	53,19%	64,62%	11,43%	19,66	De acordo com a evolução da obra
					COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	TOTAL
2	CALÇADAS								
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	74,16	1.211,84	45,70	1,51		69,12	Lado Direito
								Total item 2.3	69,12
					COMPRIMENTO	LARGURA	% EXECUTADO	TOTAL	
3	CICLOFAIXA								
3.1	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	3,12	532,71	313,60	1,85	35,00%	181,10	Dreno executado lado esquerdo
								Total item 3.1	181,10
					COMPRIMENTO	LARGURA	% EXECUTADO	TOTAL	
3.2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	131,59	532,71	313,60	1,85	35,00%	181,10	Dreno executado lado esquerdo
								Total item 3.2	181,10
					COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	TOTAL

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.07.13 16:04:41 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claudioilton Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO



Documento assinado digitalmente

JOSE SERGIO BEZERRA GOMES


Data: 14/07/2023 06:34:48 -0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

A.D.S - CONSTRUTORA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA – PORTAL E ACESSIBILIDADE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE DE FERREIROS, PE

VISÃO GERAL DOS SERVIÇOS

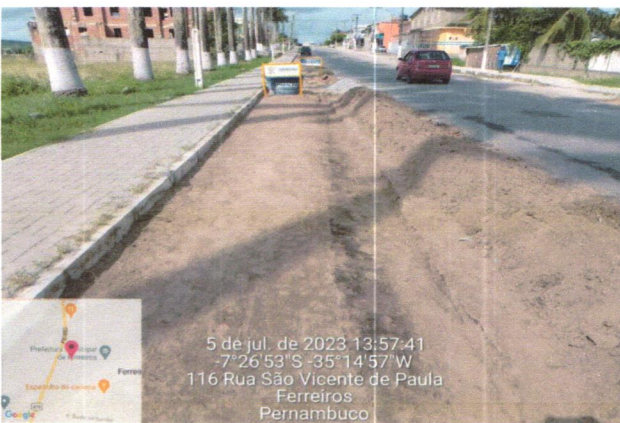


5 de jul. de 2023 13:57:41
-7°26'53"S -35°14'57"W
116 Rua São Vicente de Paula
Ferreiros
Pernambuco



5 de jul. de 2023 14:06:01
-7°26'53"S -95°14'49"W
59 Rua Francisco T. Maciel
Ferreiros
Pernambuco



5 de jul. de 2023 14:06:11
-7°26'54"S -35°14'50"W
59 Rua Francisco T. Maciel
Ferreiros
Pernambuco

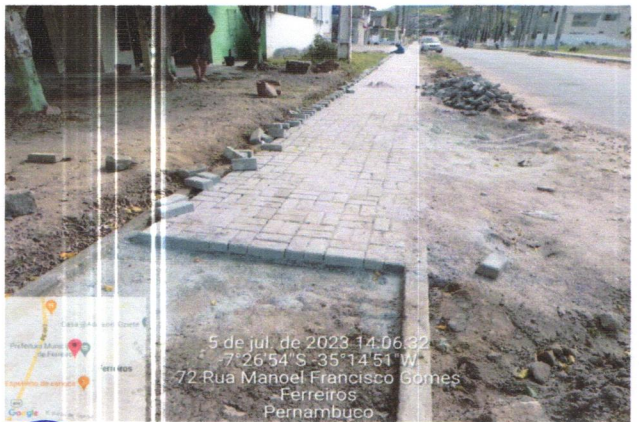

5 de jul. de 2023 14:06:32
-7°26'54"S -35°14'51"W
72 Rua Manoel Francisco Gomes
Ferreiros
Pernambuco

Claudionor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo
Mat. 608-4




Documento assinado digitalmente
JOSE SERGIO BEZERRA GOMES
Data: 14/07/2023 06:32:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031
429

Assinado de forma digital
por ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.07.13 16:04:54
-03'00'

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA – PORTAL E ACESSIBILIDADE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE DE FERREIROS/PE

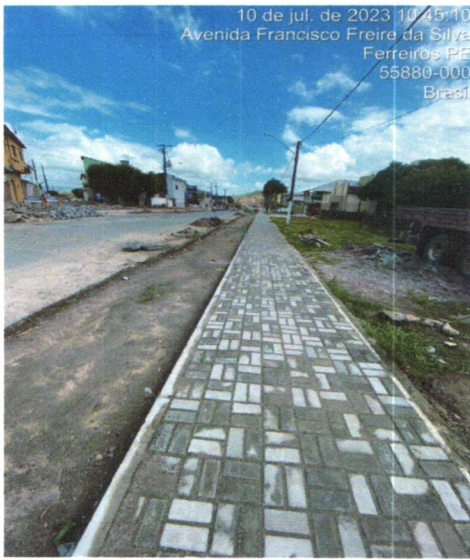

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2023.07.13 16:05:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claudionor Manoel da Oliveira
Secretaria de Planejamento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO



Documento assinado digitalmente
JOSE SERGIO BEZERRA GOMES
Data: 14/07/2023 06:31:03 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

A.D.S - CONSTRUTORA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
