

BOLETIM DE MEDIÇÃO

002

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE	DATA MEDIÇÃO:	05/06/2023	VALOR DA MEDIÇÃO:	73.030,75
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE	CONTRATO:	069/PMF/2022	CONTRATO R\$:	434.057,60
ORDEM DE SERVIÇOS:	MODALIDADE:	TP 004/2022	ADITIVO R\$:	0,00
EMPRESA CONTRATADA:	PRAZOS DE EXEC.:	18/04/2023	C. ADITADO R\$:	434.057,60
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PRAZO (DIAS):	150	DATA FINAL:	15/09/2023
	PROPRIETÁRIO:	CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA	P. RESTANTE DIAS:	102
	CPF:	023.498.134-28	SALDO R\$:	286.449,85
	CREA:	181.894.289-5	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	08/05/2023
				À
				05/06/2023



GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA
 FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA
 ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO				
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26	M2	266,81	8,00	0,00	0,00	36.595,40	5.758,18	11.586,02	0,00	0,00%
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	0,09	4.253,33	719,95	1.455,99	2.134,49	64,79	131,04	131,04	34,23%
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M2	10,00	1.276,00	215,99	436,80	12.760,00	2.159,90	4.368,00	4.368,00	34,23%
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	800,01	12,00	2,00	4,00	9.600,12	1.600,02	3.200,04	3.200,04	33,33%
1.5	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,59	200,00	33,00	66,00	11.718,00	1.933,47	3.866,94	3.866,94	33,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO						397.462,20	67.272,56	136.041,72	136.041,72	
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	51,49	1.442,06	244,00	493,32	74.251,66	12.563,56	25.401,04	25.401,04	34,21%

Claudionor Manoel de Oliveira
 Sec. de Obras e Urbanismo
 Matr: 60824

Ítalo Henrique Cavalcante de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA RN 160 991 108-3

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	75,99	4.253,33	719,95	1.455,99	323.210,54	54.709,00	110.640,68	34,23%
TOTAL							434.057,60	73.030,75	147.607,75	34,01%

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

Ítalo Henrique Cavalcante de Almeida

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claudionor Manoel de Oliveira
Sec. de Obras e Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Ítalo Henrique Cavalcante de Almeida
Engenheiro Civil
CREA RN 160 991 108-3

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM

002

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE		MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
					MEDIDA NO PERÍODO			
1.0	SERVÍCIOS PRELIMINARES							
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	0,09	4.253,33	719,95		719,95	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransfereGov - Rua Projetada 10
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO S DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M2	10,00	1.276,00	215,99		215,99	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransfereGov - Rua Projetada 10
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	800,01	12,00	2,00		2,00	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransfereGov - Rua Projetada 10
1.5	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,59	200,00	33,00		33,00	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransfereGov - Rua Projetada 10
2.0	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	51,49	1.442,06	244,00		244,00	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransfereGov - Rua Projetada 10
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	75,99	4.253,33	719,95		719,95	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransfereGov - Rua Projetada 10

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.





Italo Henrique Cavalcante de Almeida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claudionor Manoel de Oliveira
 Sec. de Obras Urbanismo
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 GESTOR DE CONTRATO

[Assinatura]
 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARÁ SEDE DESTA MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

VISÃO GERAL DA OBRA

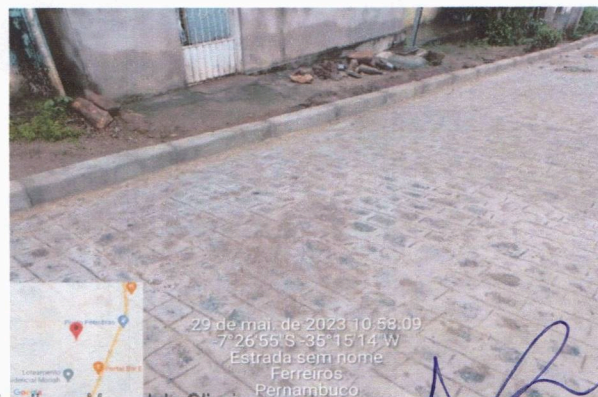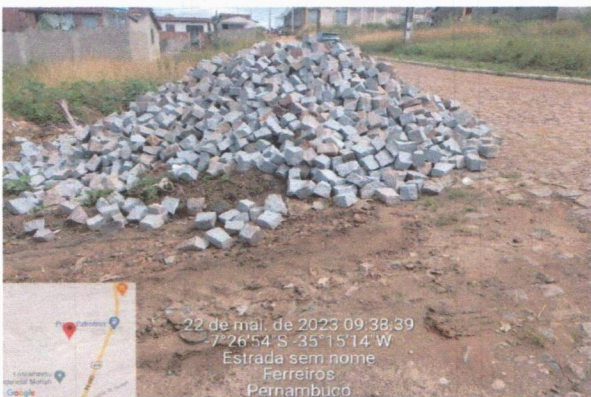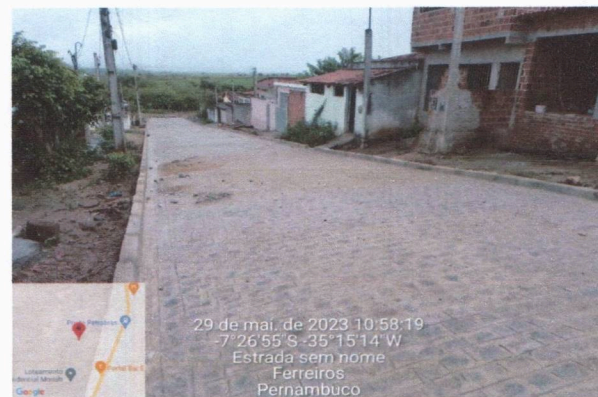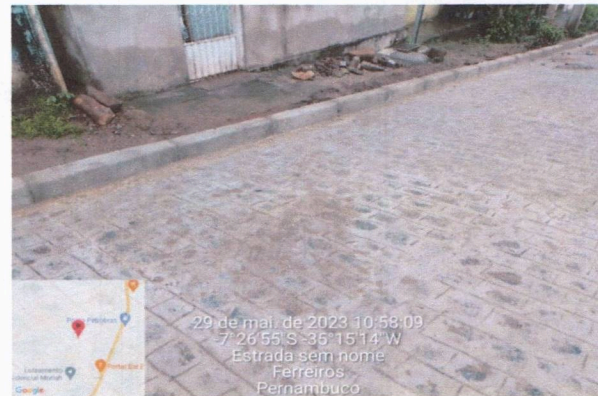

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

Ital H C Almeida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claudionor Manoel de Oliveira
Secretaria de Urbanismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

[Signature]
C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Dr. Henrique Cavalcante de Almeida
Engenheiro Civil
A.R.N 160 991 108-3
