


Passou 41 sec obra

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

## 006

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE</b> <b>OBJETO:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE <b>CONTRATO:</b> 069/PMF/2022 MODALIDADE: TP 004/2022 <b>ORDEM DE SERVIÇOS:</b> 18/04/2023 PRAZO (DIAS): 150 <b>EMPRESA CONTRATADA:</b> C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b> ADRIANA NUNES DOS SANTOS		<b>DATA MEDIÇÃO:</b> 05/12/2023 <b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> 53.063,15 <b>CONTRATO R\$:</b> 434.057,60 <b>ADITIVO R\$:</b> 0,00 <b>C. ADITADO R\$:</b> 434.057,60 <b>DATA FINAL:</b> 12/02/2024 <b>P. RESTANTE DIAS:</b> 69 <b>SALDO R\$:</b> 0,00 <b>PERÍODO DE MEDIÇÃO:</b> 06/11/2023 A 05/12/2023						
<b>CONTRATO:</b> 069/PMF/2022 <b>PRAZOS DE EXEC.:</b> 18/04/2023 <b>ADITIVO (DIAS):</b> 150 <b>PROPRIETÁRIO:</b> CRISTIANO SEVERINO DE SOUZA <b>CPF:</b> 023.498.134-28 <b>CREA:</b> 181.894.289-5 <b>PERÍODO DE MEDIÇÃO:</b> 06/11/2023 A 05/12/2023		<b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> 53.063,15 <b>CONTRATO R\$:</b> 434.057,60 <b>ADITIVO R\$:</b> 0,00 <b>C. ADITADO R\$:</b> 434.057,60 <b>DATA FINAL:</b> 12/02/2024 <b>P. RESTANTE DIAS:</b> 69 <b>SALDO R\$:</b> 0,00 <b>PERÍODO DE MEDIÇÃO:</b> 06/11/2023 A 05/12/2023						
<b>GESTOR DE CONTRATO:</b> CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA <b>FISCAL DE CONTRATO:</b> FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA <b>ENGENHEIRO FISCAL:</b> ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA		<b>MATRÍCULA:</b> 608-4 <b>CREA/RPN:</b> 160.666.136-1 <b>CREA/RPN:</b> 160.991.108-3 PE20230941711						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE		FINANCEIRO		ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
				MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26	M2	266,81	8,00	8,00	36.595,40	5.115,78	36.595,40
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	M2	0,09	4.253,33	4.253,33	2.134,49	0,00	2.134,49
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO S DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M2	10,00	1.276,00	1.276,00	382,79	46,09	382,79
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	800,01	12,00	12,00	12.760,00	1.536,20	12.760,00
1.5	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,59	200,00	200,00	9.600,12	1.933,47	9.600,12
2.0	PAVIMENTAÇÃO					397.462,20	47.937,37	397.462,20
2.1	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	51,49	1.442,06	1.442,06	74.251,66	9.025,17	74.251,66

  
**ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031**  
 Sec. de Obras e Urbanismo  
 Mat. 608-4

Assinado de forma digital por  
 ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
 Dados: 2023.12.05 09:05:12 -03'00'  
**429**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE		FINANCEIRO		ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	75,99	4.253,33	512,07	323.210,54	38.912,20	100,00%
<b>TOTAL</b>						<b>434.057,60</b>	<b>53.053,15</b>	<b>100,00%</b>

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
 Dados: 2023.12.05 09:05:26 -03'00'

Assinado de forma digital por PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO

Assinado de forma digital por C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Claudio Manoel de Oliveira  
 Sec. de Obras e Urbanismo  
 Mat. 608-4

# MEMORIAL DE CÁLCULO




**BM**

**006**

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARÁ SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS. - PE

## RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE		MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
					MEDIDA NO PERÍODO	PERÍODO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	M2	0,09	4.253,33	512,07		512,07	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransfereGov - Rua Projetada 08
1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M2	10,00	1.276,00	153,62		153,62	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransfereGov - Rua Projetada 08
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	800,01	12,00	2,00		2,00	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransfereGov - Rua Projetada 08
1.5	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,59	200,00	33,00		33,00	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransfereGov - Rua Projetada 08
2.0	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	51,49	1.442,06	175,28		175,28	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransfereGov - Rua Projetada 08
2.2	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	75,99	4.253,33	512,07		512,07	Trecho executado - de acordo com a Plataforma TransfereGov - Rua Projetada 08

  
 512,07  
 Claudionor Manoel de Oliveira  
 Sec. de Obras e Urbanismo  
 Mat. 608-4

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
 Dados: 2023.12.05 09:05:39 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
 GESTOR DE CONTRATO

C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARÁ SEDE DEST E MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RUA PROJETADA 08

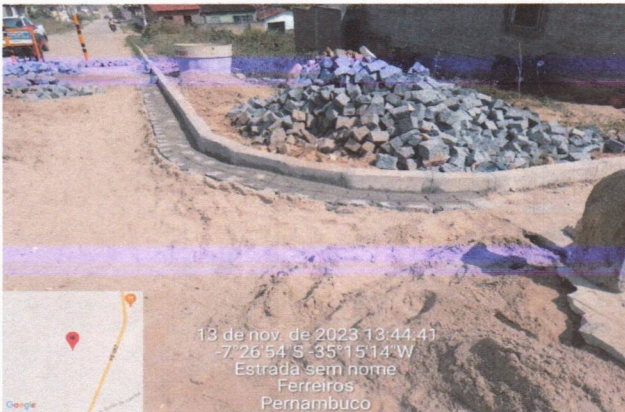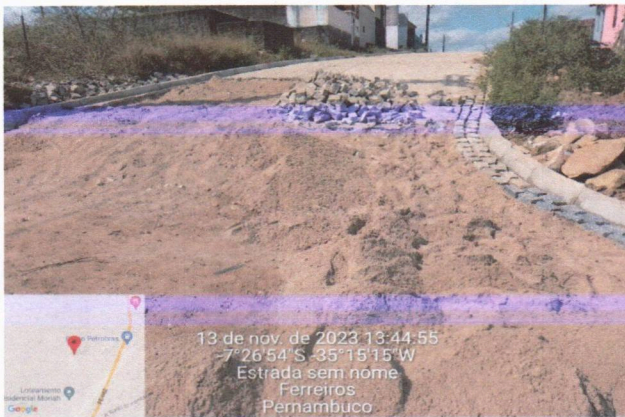
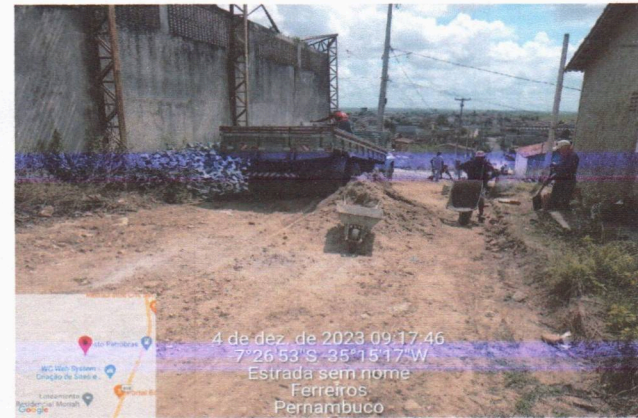


ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:079630314  
29

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2023.12.05 09:05:52 -03'00'

*Claudio*  
Claudionor Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PARÁ SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

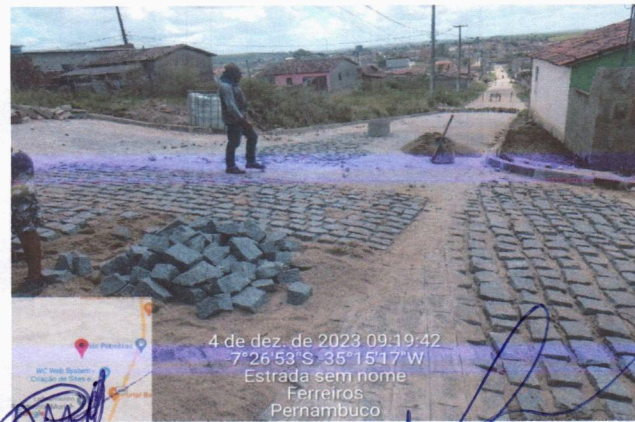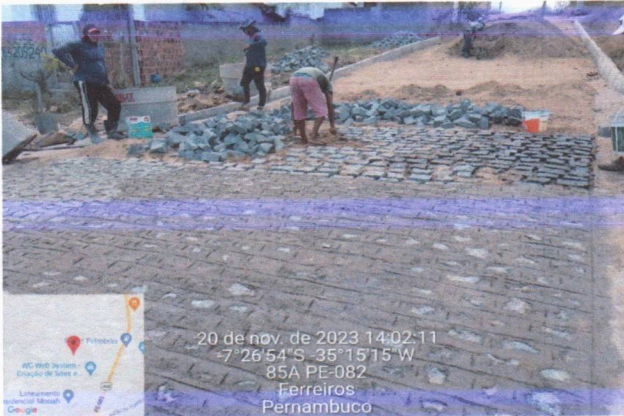

*Claudio Manoel de Oliveira*  
**Claudio Manoel de Oliveira**  
 Sec. de Obras e Urbanismo  
 Mat. 608-4

*[Signature]*  
 C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE  
 CAVALCANTE DE  
 ALMEIDA:07963031429

Assinado da forma digital por  
 ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE  
 ALMEIDA:07963031429  
 Desde 2023.12.05 09:06:15 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
 GESTOR DE CONTRATO
