

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

002

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 21/03/2024

VALOR DA MEDIÇÃO: 71.412,99



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 4 NO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS, MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

CONTRATO: 001/2024 MODALIDADE: TP 002/2023 PRAZOS DE EXEC.: 11/01/2024 10/05/2024

CONTRATO R\$: 165.731,08

ORDEM DE SERVIÇOS: 11/01/2024 PRAZO (DIAS): 120

ADITIVO (DIAS): -

ADITIVO R\$: 0,00

EMPRESA CONTRATADA: JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA

PROPRIETÁRIO: JORGE MOZART DE ALBUQUERQUE II

C. ADITADO R\$: 165.731,08

CNPJ: 32.507.681/0001-75

CPF: 009.682.564-22

DATA FINAL: 10/05/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARK ANDRADE DE PAULA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 22/02/2024

P. RESTANTE DIAS: 50

CREA: 181.084.900-04

MATRÍCULA: 608-4

SALDO R\$: 16.101,29

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA

CREA/RPN: 160.666.136-1

A

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA

CREA/RPN: 160.991.108-3

21/03/2024

ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

CNO: 90.018.00352/76

16.101,29

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE REPROGRAMADA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	FINANCEIRO		
							VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						893,04	0,00	893,04
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	297,68	3,00	0,00	3,00	893,04	0,00	893,04
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						8.749,92	3.770,33	7.899,42
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	107,69	48,00	20,68	43,33	5.169,12	2.227,37	4.666,68
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,30	96,00	41,37	86,67	3.580,80	1.542,96	3.232,74
3	RUA PROJETADA 4						163.200,68	67.642,66	140.837,33
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	70,84	1.753,21	763,21	1.612,30	124.197,39	54.065,44	114.215,33
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIOS), AF_06/2016	M	45,90	631,88	295,80	580,00	29.003,29	13.577,22	26.622,00
4	SINALIZAÇÃO						2.887,44	0,00	0,00
4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	85,55	6,00	0,00	0,00	513,30	0,00	0,00
4.2	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lido de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	395,69	6,00	0,00	0,00	2.374,14	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>165.731,08</b>	<b>71.412,99</b>	<b>149.629,79</b>

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO



# MEMORIAL DE CÁLCULO

# BM 002

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 4 NO LOTEAMENTO MARIA BERNARDETE BORBA CAMPOS, MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE



## RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREGO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO		
					% BM ANTERIOR	% BM ATUAL	EVOLUÇÃO (%)
<b>2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	107,89	48,00	47,19%	90,28%	43,09%
				<b>Total a medir item 2.1</b>			
				<b>TOTAL</b>	<b>20,68</b>		
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,30	96,00	47,19%	90,28%	43,09%
				<b>Total a medir item 2.2</b>			
				<b>TOTAL</b>	<b>41,37</b>		
<b>3 RUA PROJETADA 4</b>							
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_06/2020	m²	70,84	1.753,21	20,00	6,30	
				<b>COMPRIMENTO</b>	<b>20,00</b>	<b>LARGURA</b>	
					20,00	5,35	107,00
					20,00	4,80	96,00
					20,00	5,00	100,00
					20,00	4,80	96,00
					20,00	4,75	96,00
					20,00	4,95	98,00
					20,00	5,05	101,00
					20,00	5,38	107,50
					20,00	5,83	116,50
					20,00	6,00	120,00
					20,00	6,00	120,00
					20,00	5,90	118,00
					33,00	6,10	201,30
					1,50	9,00	9,00
					-449,10	-449,10	-449,10
				<b>Total a medir item 3.1</b>			<b>763,21</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>287,00</b>		
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	45,90	631,88	287,00		
				<b>COMPRIMENTO</b>	<b>287,00</b>		
					293,00		293,00
					-284,20		-284,20
				<b>Total a medir item 3.2</b>			<b>295,80</b>

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE  
DE ALMEDADA/7963031429

PREFETURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

Claudioitor Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 6084









MARK ANDRADE DE PAULA  
Data: 21/03/2024 10:11:20-0300  
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA  
RESPONSÁVEL EXECUÇÃO



PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 4 NO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS, MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

VISÃO GERAL DA OBRA

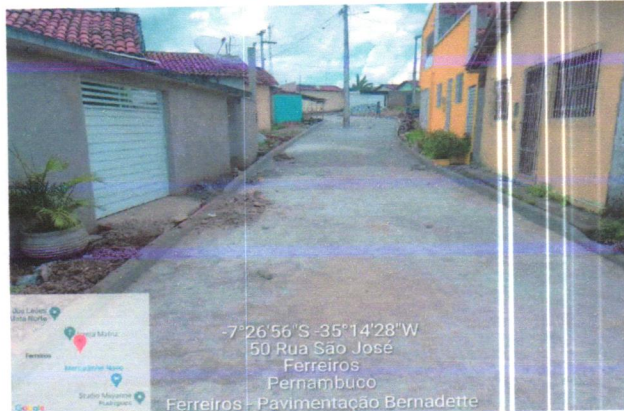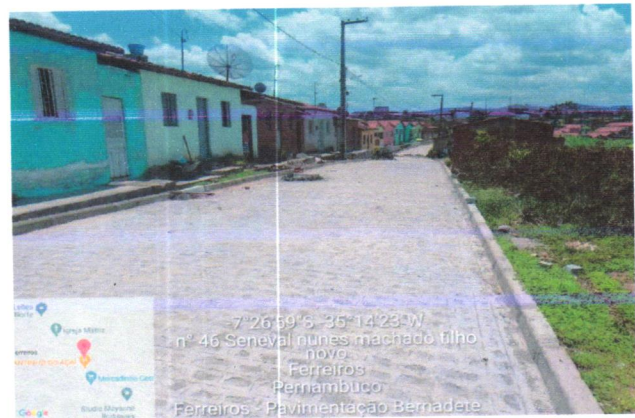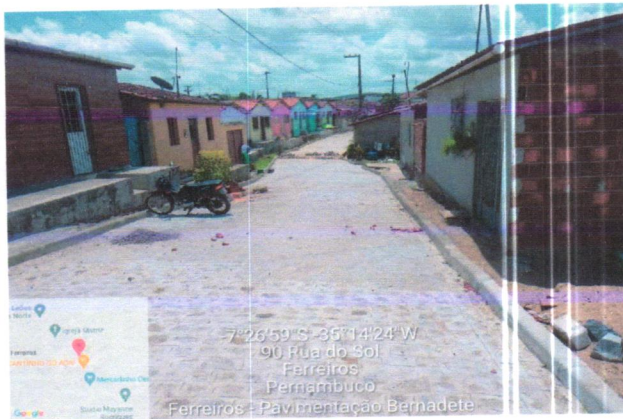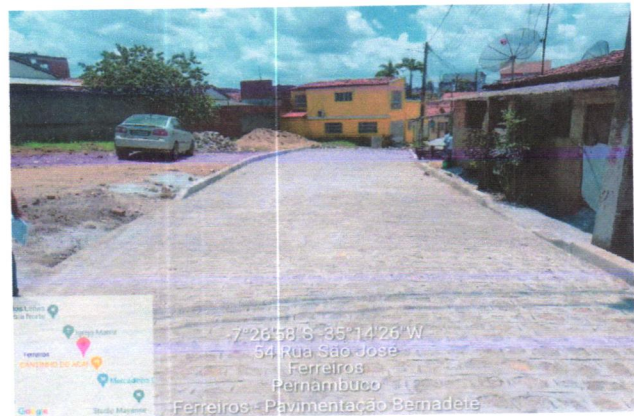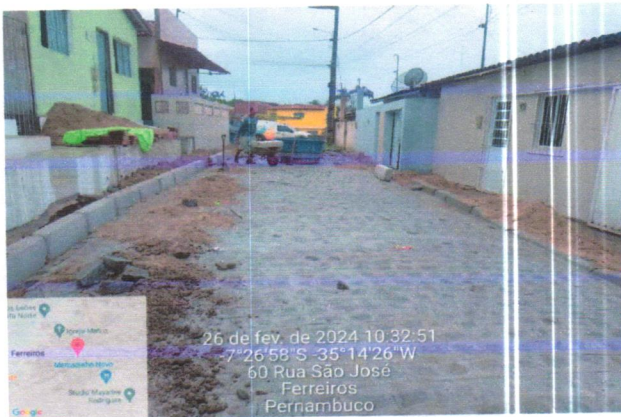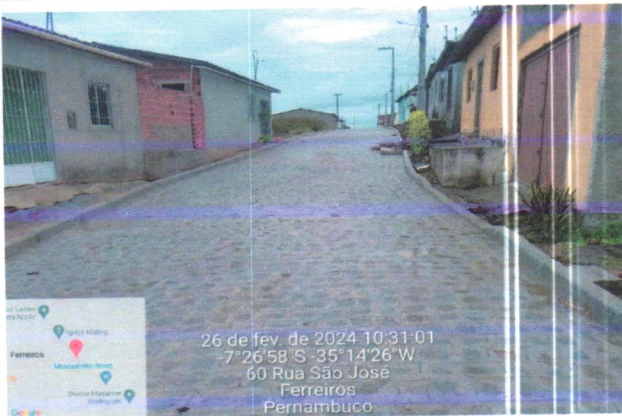

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2024.03.21 08:53:18 -03'00'

Markel de Oliveira  
Secretaria de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4



gov.br

Documento assinado digitalmente  
MARK ANDRADE DE PAULA  
Data: 21/03/2024 10:11:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 4 NO LOTEAMENTO MARIA BERNADETE BORBA CAMPOS, MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

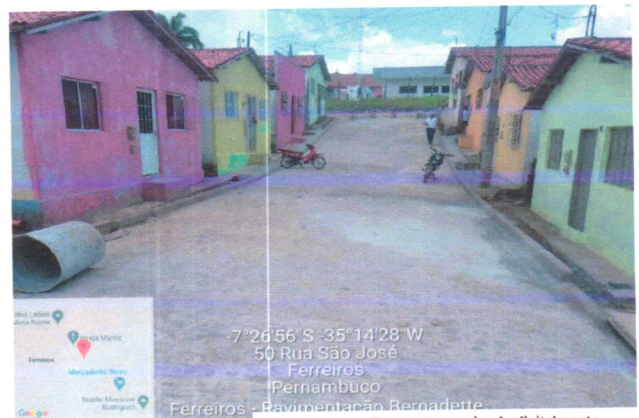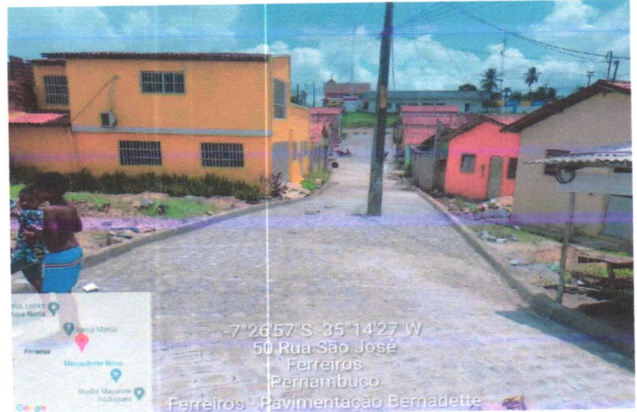

Documento assinado digitalmente

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429. Dados: 2024.03.21 08:53:28 -0'100'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO



MARK ANDRADE DE PAULA

Data: 21/03/2024 10:11:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JM ENRIQUE MURIMEN LUS LIMA LIMA RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Claudionor Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4
