



PCA DEZESSEIS DE MARÇO
08.825.713/0001-04

0118/0003

Dados do Fornecedor

Código 570	Nome do Fornecedor CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Endereço RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO		Cidade TIMBAUBA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.610.140/0001-35	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS E A EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS – PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. RELATIVO A PARTE DO 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.	Valor Bruto R\$: 184,33
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
10	PODER LEGISLATIVO	Ficha: 03
10 10 01	CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	
01.031.3000.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 25/11/2022	Vencimento 25/11/2022	Saldo Anterior:	31.493,16
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação 000028/21	Processo	Valor do Subempenho:	184,33
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	31.493,16
			Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Líquido R\$:

184,33

VALOR A SER PAGO R\$

184,33

Deduzido da dotação própria 25/11/2022 RAQUEL BARBOSA DE SOUZA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 25/11/2022 elevanton Responsável		
Liquidado em : 25/11/2022 Responsável pela Liquidação	Pague-se: 25/11/2022 GILCEMIO OLIVEIRA PONTES	Ord. de Crédito Nº:	Data: 25/11/22 MARIA RIZJANE FERREIRA CAVALCANTE

Cheque Nº:

Conta: 185-4

Data: 25/11/2022

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 184,33

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____ Assinatura: _____



CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO
08.825.713/0001-04

Nota de Subempenho

0140/0001

Dados do Fornecedor

Código 570	Nome do Fornecedor CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cidade TIMBAUBA	U.F. PE
Endereço RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO		Agência	Conta
C.N.P.J./C.P.F. 10.610.140/0001-35		Banco	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ORÇAMENTO, QUE INTEGRA AO EDITAL COMO ANEXO I - PROCESSO: Nº 028/2021 NA MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 001/2021. RELATIVO A CONCLUSÃO DA OBRA NO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO 8º (OITAVO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.

Valor Bruto R\$:

20.376,56

Código

Classificação da Despesa Empenhada

10
10 10 01
4.4.90.51.91
01.031.3000.1001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
OBRAS EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

Ficha: 03

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 25/11/2022	Vencimento 25/11/2022	Saldo Anterior:	90.821,36
Licitação (modalidade) OBRA CONVITE	Nº da Licitação 000028/21	Processo	Valor do Subempenho:	20.376,56
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	20.376,56
			Saldo Atual:	70.444,80

Descontos: 9012 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS

904,68

Valor Liquidado R\$:

19.471,88

VALOR A SER PAGO R\$

19.471,88

Deduzido da dotação própria 25/11/2022

RAQUEL BARBOSA DE SOUZA

Responsável pela Elaboração

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: 25/11/2022

claudia

Responsável

Liquidado em :25/11/2022

Pague-se: 25/11/2022

Ord. de Crédito Nº:

Data: 25/11/22

Responsável pela Liquidação

Gilceud Oliveira Pontes
GILCEUD OLIVEIRA PONTES

Maria Rejane Ferreira Cavalcante
MARIA REJANE FERREIRA CAVALCANTE

Cheque Nº:

Conta: 185-4

Data: 25/11/2022

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 19.471,88

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: / / Assinatura: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA****SECRETARIA DA FAZENDA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Rua Dr. Alcebiades N° 276 - Centro, CEP 55870-000 - TIMBAÚBA - PE TEL.: (81)3631-3485 CNPJ: 11.361.904/0001-69



Número da Nota:

00000108

Competência:

NOV/2022

Data e Hora Emissão:

25/11/2022 10:27:55

Código de Verificação:

D4A1-NV56G**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

FERREIROS - PE

Local da Prestação:

FERREIROS - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

10.610.140/0001-35

Inscrição Municipal:

524748

Nome/Razão Social:

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO, JARDIM PARARA, 123 A

Município:

TIMBAÚBA

UF:

PE

CEP:

55870000

E-mail:

ramostricolor.servcont@gmail.com

TEL:

8136313847**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

08.825.713/0001-04

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

ISENTO

Nome/Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Endereço:

PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO, 74/76 CENTRO

Município:

FERREIROS

UF:

PE

CEP:

55880000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE #QTD.1 - V.U.ND. R\$20.560,89 - TOTAL: R\$20.560,89

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE PROCESSO LICITATORIO N. 028/2021 CARTA CONVITE N. 002/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO 008
60% MATERIAL = R\$ 12.336,53
40% MAO DE OBRA = R\$ 8.224,36
TOTAL = R\$ 20.560,89DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0446-4
CONTA CORRENTE - 46.457-0**ATESTO**Atesto(a) a realização/fornecimento de serv
e ou produtos conforme especificação da nota fiscal.

Funcionário Responsável

Mat: 210**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.560,89**

Atividade Prestada:

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
20.149,67	0,00	20.560,89	2,00%	411,22
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

612362937939204

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-timbauba/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE FERREIR
Conta Origem:	0877/006/00000185-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.825.713/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0446/46457-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CONFIANCA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ	10.610.140/0001-35
Valor:	R\$19.656,21
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	VALOR REF SERV OBRA CAMAR
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONSTRUCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Data de Débito:	25/11/2022
Data da Operação:	25/11/2022
Código da Operação:	00133387
Chave de Segurança:	66MCFR8W922GMYG1

CPFs Autorizadores:
064.266.764-03
050.039.284-67

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE</p> <p>LOCAL: PRAÇA DEZESEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE</p> <p>EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35</p> <p>RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154</p> <p>RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095</p>	<p>PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021</p> <p>CARTA CONVITE Nº: 002/2021</p> <p>CONTRATO Nº: 028/2021</p> <p>VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15</p> <p>ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16</p>	<p>ORDEM DE SERVIÇO: 29/12/2021</p> <p>PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS</p> <p>PRAZO TRANSCORRIDO: 331 DIAS</p> <p>PRAZO RESTANTE: 29 DIAS</p> <p>ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS</p>	<p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 008</p> <p>VALOR TOTAL DO BM: R\$ 20.560,89</p> <p>VALOR ACUMULADO: R\$ 210.401,63</p> <p>% ACUMULADO: 74,92%</p> <p>PERÍODO: 09/11/2022 À 24/11/2022</p> <p>DATA DE ELABORAÇÃO: 24/11/2022</p>
--	---	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					6.976,07		292,72		4.984,48		991,60
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	92,84	4,00	371,36	0,29	26,92	3,00	276,52	1,00	92,85
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,81	96,00	3.629,76	7,03	265,80	72,23	2.731,01	23,77	898,75
1.3	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22	M2	452,03	1,00	452,03	-	-	1,00	452,03	-	-
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	99,02	15,38	1.522,92	-	-	15,38	1.522,92	-	-
1.0 INFRAESTRUTURA					31.009,43				31.009,43		
1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO	M3	39,30	55,66	2.187,43	-	-	55,66	2.187,43	-	-
1.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	3.278,86	6,09	19.968,37	-	-	6,09	19.968,37	-	-
1.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.813,28	3,16	8.889,96	-	-	3,16	8.889,96	-	-
1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	3.021,12	0,65	1.963,72	-	-	0,65	1.963,72	-	-
2.0 FUNDAÇÕES					37.285,64				37.285,64		
2.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	2.820,32	12,47	35.169,39	-	-	12,47	35.169,39	-	-
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	35,92	58,36	2.096,29	-	-	58,36	2.096,29	-	-
3.0 PAREDES E REVESTIMENTOS					75.202,92				67.515,71		7.686,31
3.1	ALVENARIA DE TUILOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1 VEZ	M2	49,47	57,39	2.839,08	-	-	57,39	2.839,08	-	-
3.2	ALVENARIA DE TUILOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1/2 VEZ.	M2	53,22	739,29	39.345,01	-	-	739,29	39.345,01	-	-
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	3,86	948,75	3.662,17	-	-	948,75	3.662,17	-	-
3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	22,84	948,75	21.869,45	-	-	948,75	21.869,45	-	-
3.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEIS, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO	M2	39,15	196,33	7.686,31	-	-	-	-	196,33	7.686,31
4.0 FORRO					8.025,00		8.025,00		8.025,00		
4.1	FORRO EM PLACA DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	37,50	214,00	8.025,00	214,00	8.025,00	214,00	8.025,00	-	-
5.0 PISOS					26.536,28		4.989,34		18.228,78		10.310,52
5.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8	M2	39,30	158,45	6.227,08	-	-	158,45	6.227,08	-	-
5.2	PISO CERÂMICO ESMALTADO 45 X 45 CM, TIPO A, PEI 5 ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA - 6MM).	M2	48,18	214,00	10.310,52	-	-	-	-	214,00	10.310,52
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO	M2	47,84	209,88	9.988,88	104,94	4.989,34	209,88	9.988,88	-	-

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.11.24 16:55:28
-03'00'

eleuilton gomes dos santos diaz
707-909.964.40
710



8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE LOCAL: PRAÇA DEZESESSE DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154 RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021 CARTA CONVITE Nº: 002/2021 CONTRATO Nº: 028/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15 ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16	ORDEN DE SERVIÇO: 29/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 331 DIAS PRAZO RESTANTE: 29 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 008 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 20.560,89 VALOR ACUMULADO: R\$ 210.401,63 % ACUMULADO: 74,92% PERÍODO: 09/11/2022 À 24/11/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 24/11/2022
---	---	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UB.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		8ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 8ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
6.0	ESQUADRIAS			19.418,96		2.874,83		2.874,83		18.544,13	
6.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS. INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	375,06	30,66	11.499,33	7,67	2.874,83	7,67	2.874,83	23,00	8.624,50
6.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM ALIZAR. AF. 12/2019	M2	480,20	7,14	3.428,62	-	-	-	-	7,14	3.428,62
6.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAE, ACABAMENTO E CONTAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	557,89	8,05	4.491,01	-	-	-	-	8,05	4.491,01
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			23.437,43		1.418,96		6.138,96		17.297,47	
7.1	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR. INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	17,95	25,00	448,75	-	-	-	-	25,00	448,75
7.2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR. INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	29,99	2,00	59,98	-	-	-	-	2,00	59,98
7.3	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO CONJUGADA COM TOMADA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR. INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	19,65	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	PT	176,33	60,00	10.579,80	-	-	-	-	60,00	10.579,80
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3,11	500,00	1.555,00	75,00	233,25	325,00	1.010,75	175,00	544,25
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	6,25	600,00	3.750,00	90,00	563,40	390,00	2.441,40	210,00	1.314,60
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	7,67	200,00	1.534,00	30,00	230,10	130,00	997,10	70,00	536,90
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	8,67	300,00	2.601,00	45,00	390,15	195,00	1.690,65	105,00	910,35
7.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	82,94	35,00	2.902,90	-	-	-	-	35,00	2.902,90
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			9.888,59		2.852,19		4.798,19		4.788,48	
8.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	71,12	8,00	568,96	-	-	-	-	8,00	568,96
8.2	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	94,92	5,00	474,60	-	-	-	-	5,00	474,60
8.3	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	103,42	3,00	310,26	-	-	-	-	3,00	310,26
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR. INCLUSIVE TAMPAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	UN	425,90	3,00	1.277,70	-	-	-	-	3,00	1.277,70
8.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR. INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN	181,85	3,00	545,55	-	-	-	-	3,00	545,55
8.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50X0,60 M, PARA PIA DE COZINHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	758,67	1,00	758,67	-	-	-	-	1,00	758,67
8.7	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO, DE 1,20X0,60 M, COM CUBA INTEGRADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	263,61	1,00	263,61	-	-	-	-	1,00	263,61
8.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR REF. 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	69,28	5,00	346,30	-	-	-	-	5,00	346,30
8.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	18,46	200,00	3.692,00	100,00	1.846,00	200,00	3.692,00	-	-

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
 Dados: 2022.11.24 16:55:41

eletron goms de sanza dia
 708.909.564.40
 770



8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220818154 RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021 CARTA CONVITE Nº: 002/2021 CONTRATO Nº: 028/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15 ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16	ORDEM DE SERVIÇO: 29/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 331 DIAS PRAZO RESTANTE: 29 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 008 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 20.560,89 VALOR ACUMULADO: R\$ 210.401,63 % ACUMULADO: 74,92% PERÍODO: 09/11/2022 À 24/11/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 24/11/2022
---	---	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
8.10	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO Nº, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	55,70	4,00	222,80	-	-	-	-	4,00	222,80
8.11	CURVA EM 90º, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,06	60,00	543,60	60,00	543,60	60,00	543,60	-	-
8.12	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	11,25	50,00	562,50	50,00	562,50	50,00	562,50	-	-
8.9	PINTURA				10.202,55						10.202,55
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	M2	15,90	641,67	10.202,55	-	-	-	-	641,67	10.202,55
10.0	COBERTURA				8.758,30				8.758,30		
10.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM, 6MM DE ESPESSURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL	M2	47,53	136,80	6.502,10	-	-	136,80	6.502,10	-	-
10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	18,50	136,80	2.257,20	-	-	136,80	2.257,20	-	-
11.0	LAJE				19.164,76				19.164,76		
11.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PIPISO - VÃO ACIMA DE 4,81M	M2	139,37	137,51	19.164,76	-	-	137,51	19.164,76	-	-
12.0	ACESSIBILIDADE				2.843,89						2.843,89
12.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF-04/2019-P	M	90,95	12,00	1.081,40	-	-	-	-	12,00	1.081,40
12.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	M	240,21	3,00	720,63	-	-	-	-	3,00	720,63
12.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	M	277,19	3,00	831,57	-	-	-	-	3,00	831,57
13.0	DIVERSOS				1.638,64				1.638,64		
13.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOS MACIOS.	M3	227,59	7,20	1.638,64	-	-	7,20	1.638,64	-	-
VALOR TOTAL BM DE: VINTE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS					R\$ 200.846,31	TOTAL 1ª MEDIÇÃO	R\$ 20.560,89	TOTAL ACUMULADO	R\$ 210.401,63	TOTAL SALDO	R\$ 70.446,89

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Data: 2022.11.24 16:55:51 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

CPF: 708-909-964-40

MAT: 770

Paulo Ricardo Vieira dos Santos
CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL Nº 0001-35
CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Estelina Soares Ribeiro, 123-A
Timbaíba-PE / CEP 55870-000



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
 LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE
 EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
 DATA DE ELABORAÇÃO: 24/11/2022

		UN	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	Proporcional ao andamento da obra		4,00	7,32%			0,29
						Total item 1.1	0,29
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
	Proporcional ao andamento da obra		96,00	7,32%			7,03
						Total item 1.2	7,03
4.0 FORRO							
4.1	FORRO EM PLACA DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2					
	Vide projeto básico - serviço concluído			214,00			214,00
						Total item 4.1	214,00
5.0 PISOS							
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2					
	Serviço concluído		50,00%	209,88			104,94
						Total item 5.3	104,94
6.0 ESQUADRIAS							
6.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2					
	Serviço em execução - colocação das forras das portas		25,00%	30,86			7,67
						Total item 6.1	7,67
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M					
	Vide projeto básico - serviço em execução		15,00%	500,00			75,00
						Total item 7.5	75,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M					
	Vide projeto básico - serviço em execução		15,00%	600,00			90,00
						Total item 7.6	90,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M					
	Vide projeto básico - serviço em execução		15,00%	200,00			30,00
						Total item 7.7	30,00
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M					
	Vide projeto básico - serviço em execução		15,00%	300,00			45,00
						Total item 7.8	45,00
8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
8.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M					
	Vide projeto básico - serviço em execução		50,00%	200,00			100,00
						Total item 8.9	100,00
8.11	CURVA EM 90°, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN					
	Vide projeto básico - serviço concluído			60,00			60,00
						Total item 8.11	60,00
8.12	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN					
	Vide projeto básico - serviço concluído			50,00			50,00
						Total item 8.12	50,00

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA

07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Dados: 2022.11.24 16:56:01
-03'00"

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

eleven

CPF: 708-909-964-40
MAT: 710

M. Margareta Pereira Dias
CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL


CNPJ 10.610.140/0001-35
CONFIANÇA PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Estelina Soares Ribello, 123-A
Timbaúba-PE / CEP 55870-000



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/78 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 24/11/2022

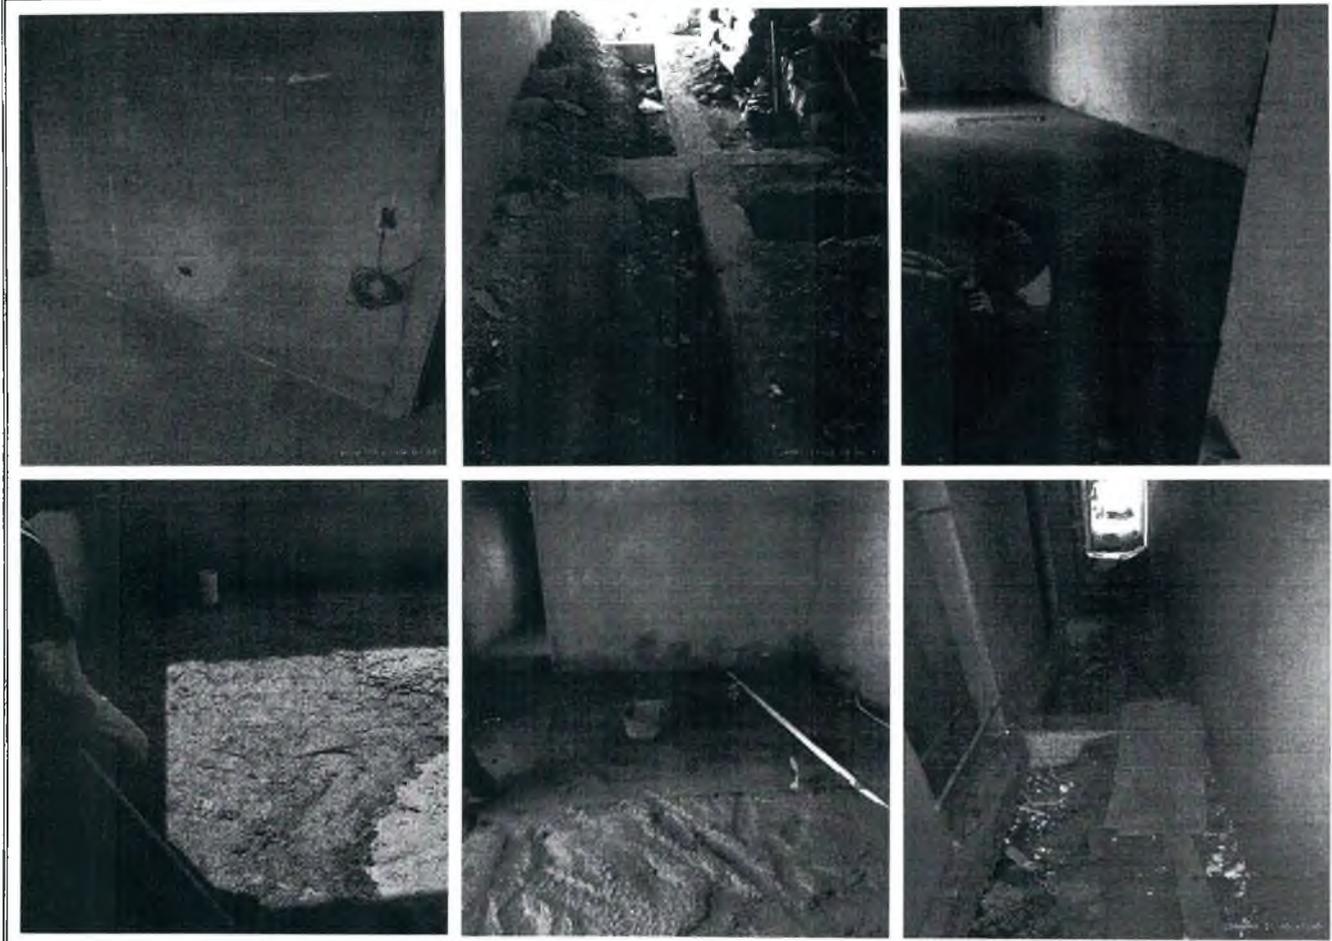

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.11.24 16:56:20 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL

CPF: 708-909-964-40
MAT: 770

CNPJ 10.610.140/0001-35
CONFIANÇA PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Estelvina Soares Ribeiro, 123-A
Timbaúba-PE / CEP 55870-000
